

Flix Instrumentacion  
Guido Spano 24, Fray Luis Beltran  
Tel: 0341-152107596



## Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	TRANSMISOR DE TEMP.
Tag:	TIR 70S-GO
Marca:	ABB
Modelo:	TTH 300
S/N:	2086721
Rango:	150°C

Información de calibración	
N° de Acta	30100045
Procedimiento:	Contraste
Fecha:	14/11/2023
Fluido de prueba	-
Cliente	Bunge SJ

### Patrones utilizados


Tag	Marca	Modelo	N°Serie	CALIBRADO
FLIX-PI-01	Druck	PM 620IS	3659498	14/12/2022

UNIDAD: °C

Inicial	50,510	75,500	100,900	150,200	100,900	75,500	50,510
Final	50,510	75,500	100,900	150,200	100,900	75,500	50,510
Patron	50,000	75,000	100,000	150,000	100,000	75,000	50,000
Error %	-1,020	-0,667	-0,900	-0,133	-0,900	-0,667	-1,020

UNIDAD: mA

Inicial	9,300	12,200	14,450	19,953	14,450	12,200	9,300
Final	9,300	12,200	14,450	19,953	14,450	12,200	9,300
Patron	9,280	12,100	14,552	19,999	14,552	12,100	9,280
Error %	-0,216	-0,826	0,701	0,230	0,701	-0,826	-0,216

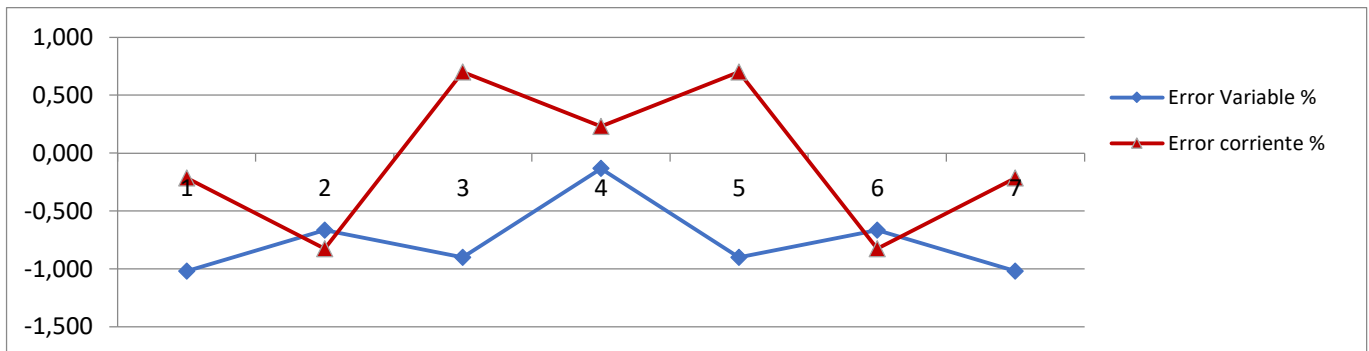

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico Lisandro Urbano

Revisado L. GUEMBERENA

