

Flix Instrumentacion  
Guido Spano 24, Fray Luis Beltran  
Tel: 0341-152107596



### Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Transmisor de Temperatura
Tag:	TT-70/2
Marca:	SIEMENS
Modelo:	TH 100
S/N:	AZB/2000325
Rango:	0 A 150 °C

Información de calibración	
N° de Acta	3000400019
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	23/2/2021
Fluido de prueba	-
Cliente	BUNGE

#### Patrones utilizados


Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Fecha calibración
FLIX-UI-01	DRUK	PM 620IS	3659498	14/12/2020

#### UNIDAD: °C

Inicial	37,400	75,600	111,600	150,600	111,600	75,600	37,400
Final	37,400	75,600	111,600	150,600	111,600	75,600	37,400
Patron	37,600	75,000	112,600	152,000	112,600	75,000	37,600
Error %	0,532	-0,800	0,888	0,921	0,888	-0,800	0,532

#### UNIDAD: Ma

Inicial	8,400	12,100	16,200	20,100	16,200	12,100	8,400
Final	8,400	12,100	16,200	20,100	16,200	12,100	8,400
Patron	8,700	12,200	16,300	20,200	16,300	12,200	8,700
Error %	3,448	0,820	0,613	0,495	0,613	0,820	3,448

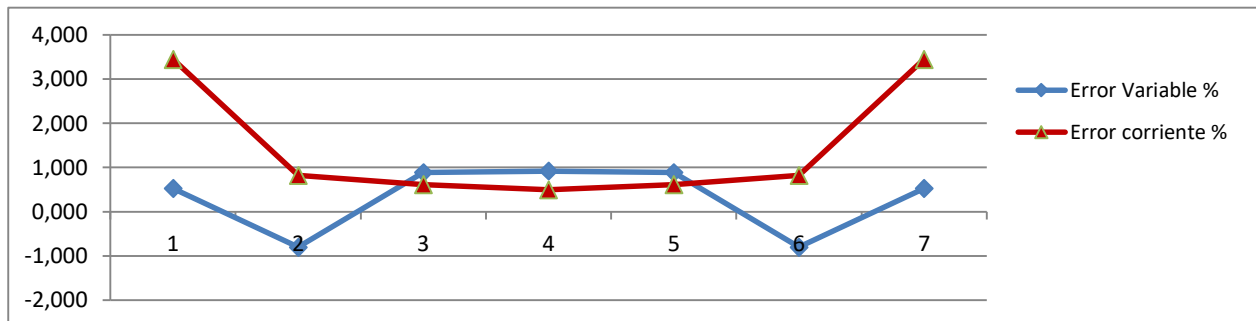

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico LUCAS VILLAFANE

Revisado L. GUEMBERENA

