

Flix Instrumentacion
Guido Spano 24, Fray Luis Beltran
Tel: 0341-152107596



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Transmisor de Temperatura
Tag:	RM-AP-AM-AW-TT2
Marca:	
Modelo:	
S/N:	
Rango:	0 A 100 °C


Información de calibración	
N° de Acta	30006000025
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	30/4/2021
Fluido de prueba	-
Cliente	BRIMAX

Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Fecha calibración
FLIX-UI-01	DRUCK	PM 620IS	3659498	16/12/2020

UNIDAD: °C

Inicial	24,400	49,900	74,800	99,800	74,800	49,900	24,400
Final	24,400	49,900	74,800	99,800	74,800	49,900	24,400
Patron	24,500	50,000	75,000	100,200	75,000	50,000	24,500
Error %	0,408	0,200	0,267	0,399	0,267	0,200	0,408

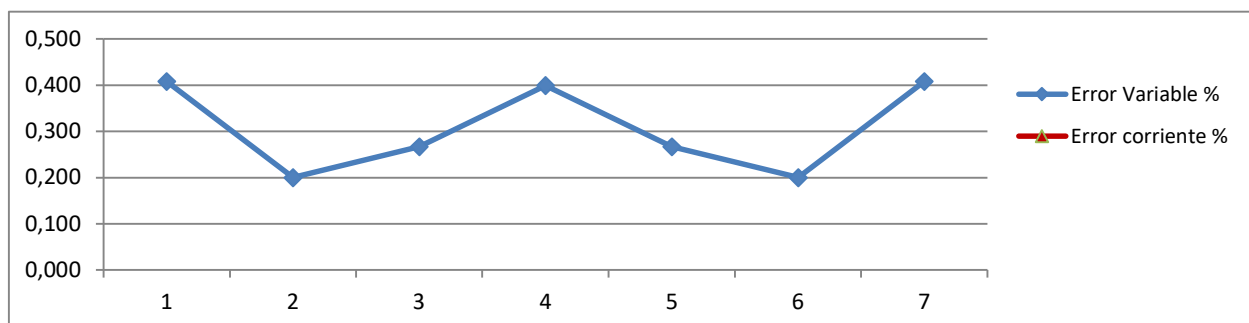

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones:

Técnico LUCAS VILLAFANE

Revisado L. GUEMBERENA
