

Flix Instrumentacion
Guido Spano 24, Fray Luis Beltran
Tel: 0341-152107596



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Transmisor de presión
Tag:	PT-AC
Marca:	ENDRES HAUSER
Modelo:	CERABAR M
S/N:	A7033B01022
Rango:	0 A 10 BAR

Información de calibración	
N° de Acta	3000200029
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	5/3/2020
Fluido de prueba	Aire
Cliente	BUNGE


Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Fecha calibración
FLIX-PI-01	Druck	PM 620IS	3659498	14/12/2020

UNIDAD: BAR

Inicial	0,000	2,500	5,000	7,500	10,000	7,500	5,000	2,500	0,000
Final	0,000	2,500	5,000	7,500	10,000	7,500	5,000	2,500	0,000
Patrón	0,000	2,512	5,014	7,515	10,001	7,514	5,013	2,511	0,000
Error BAR %	0,000	0,478	0,279	0,200	0,010	0,186	0,259	0,438	0,000

Inicial	3,970	7,990	11,990	15,990	20,000	15,990	11,990	7,990	3,980
Final	3,970	7,990	11,990	15,990	20,000	15,990	11,990	7,990	3,980
Patrón	3,990	7,998	11,996	15,994	20,001	15,996	11,994	7,998	3,991
Error mA %	0,501	0,083	0,050	0,025	0,005	0,038	0,033	0,083	0,276

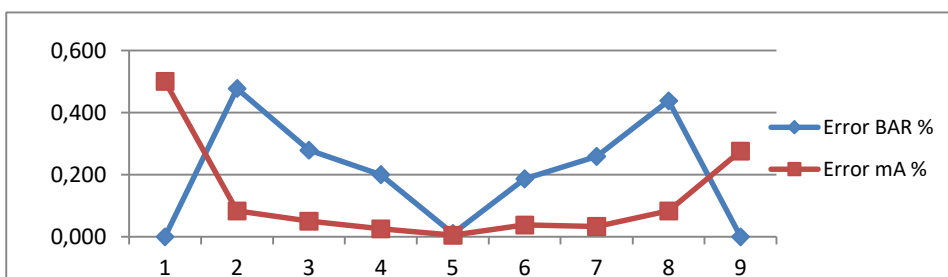

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: INCERTIDUMBRE 0.4 El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico LISANDRO URBANO

Revisado L. GUEMBERENA
