

Flix Instrumentacion
Guido Spano 24, Fray Luis Beltran
Tel: 0341-152107596



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	TRANSMISOR DE TEMP.
Tag:	TT-1103-OL/3
Marca:	Siemens
Modelo:	TH100
S/N:	YSN/H3008561
Rango:	0 A 150 °C

Información de calibración	
N° de Acta	30100144
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	19/3/2025
Fluido de prueba	-
Cliente	BUNGE PSM

Patrones utilizados


Certificado	Marca	Modelo	N°Serie	Calibrado
F9586023	FLUKE	754	63830017	21/12/2023

UNIDAD: °C

Inicial	37,500	75,000	112,480	150,000	112,480	75,000	37,500
Final	37,500	75,000	112,480	150,000	112,480	75,000	37,500
Patron	37,500	75,000	112,500	150,000	112,500	75,000	37,500
Error %	0,000	0,000	0,018	0,000	0,018	0,000	0,000

UNIDAD: mA

Inicial	8,000	11,990	15,990	19,990	15,990	11,990	8,000
Final	8,000	11,990	15,990	19,990	15,990	11,990	8,000
Patron	8,000	11,990	15,990	19,990	15,990	11,990	8,000
Error %	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

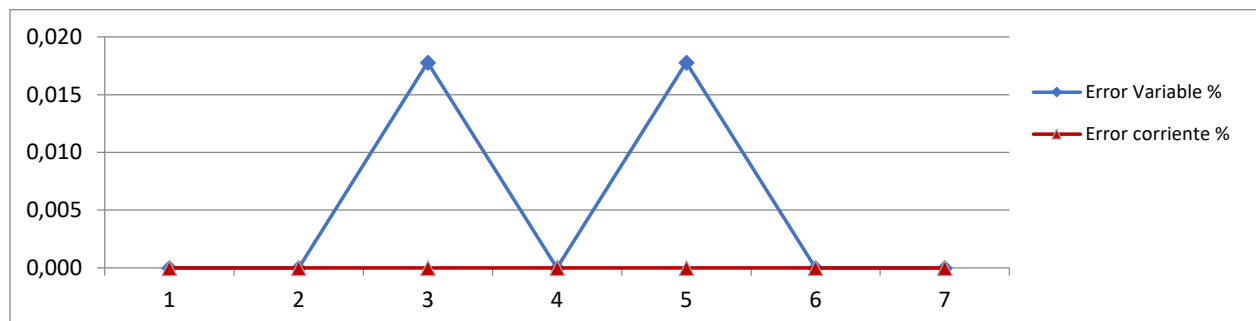

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: incertidumbre 0,4 El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico RODRIGO MAGALLANES

Revisado L. GUEMBERENA
