

Flix Instrumentacion  
 Guido Spano 24, Fray Luis Beltran  
 Tel: 0341-152107596



## Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Transmisor de presión
Tag:	PT 70DT
Marca:	Endress+Hauser
Modelo:	Deltabar S
S/N:	7C02950109D
Rango:	(-400) - 400 mmH2O

Información de calibración	
N° de Acta	2000200049
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	10/3/2021
Fluido de prueba	Aire
Cliente	LDC


### Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Fecha calibración
FLIX-PI-01	Druck	PM 620IS	3659498	14/12/2021

### UNIDAD: mmH2O

Inicial	-400,000	-200,000	0,000	200,000	400,000	200,000	0,000	-200,000	-400,000
Final	-400,000	-200,000	0,000	200,000	400,000	200,000	0,000	-200,000	-400,000
Patrón	-400,000	-200,000	0,000	200,000	400,000	200,000	0,000	-200,000	-400,000
Error BAR %	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Inicial	4,000	8,000	12,003	16,000	19,990	16,000	12,004	8,000	4,000
Final	4,000	8,000	12,003	16,000	19,990	16,000	12,004	8,000	4,000
Patrón	4,000	8,000	12,005	16,000	19,980	16,000	12,006	8,000	4,000
Error mA %	0,000	0,000	0,017	0,000	-0,050	0,000	0,017	0,000	0,000

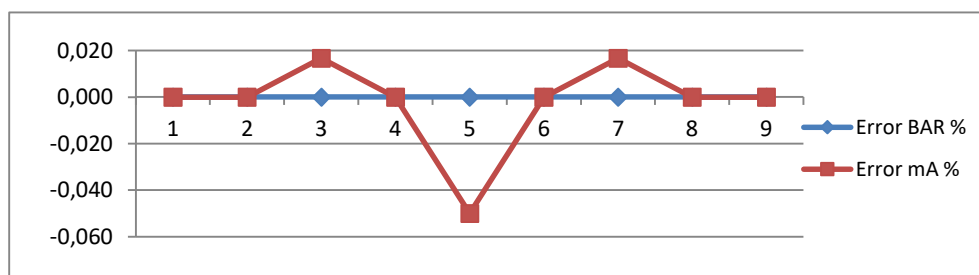

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: incertidumbre 0,4 El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico LISANDRO URBANO

Revisado L. GUEMBERENA
