

Flix Instrumentacion
Guido Spano 24, Fray Luis Beltran
Tel: 0341-152107596



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Transmisor de presión
Tag:	PT1
Marca:	ENDRESS+HAUSER
Modelo:	CERABAR M
S/N:	N4002C911--
Rango:	0 A 10 Kg/cm

Información de calibración	
N° de Acta	3000200042
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	9/3/2021
Fluido de prueba	Aire
Ciente	LDC


Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Fecha calibración
FLIX-PI-01	Druck	PM 620IS	3659498	14/12/2021

UNIDAD: BAR

Inicial	0,000	2,496	4,990	7,490	9,990	7,490	4,990	2,490	0,000
Final	0,000	2,496	4,990	7,490	9,990	7,490	4,990	2,490	0,000
Patrón	0,000	2,490	5,000	7,500	10,000	7,500	5,000	2,500	0,000
Error BAR %	0,000	-0,241	0,200	0,133	0,100	0,133	0,200	0,010	0,000

Inicial	3,990	7,990	11,900	15,980	19,970	15,980	11,990	7,990	3,990
Final	3,990	7,990	11,990	15,980	19,970	15,980	11,990	7,990	3,990
Patrón	3,990	7,990	11,990	15,990	19,980	15,990	11,990	7,990	3,990
Error mA %	0,000	0,000	0,000	0,063	0,050	0,063	0,000	0,000	0,000

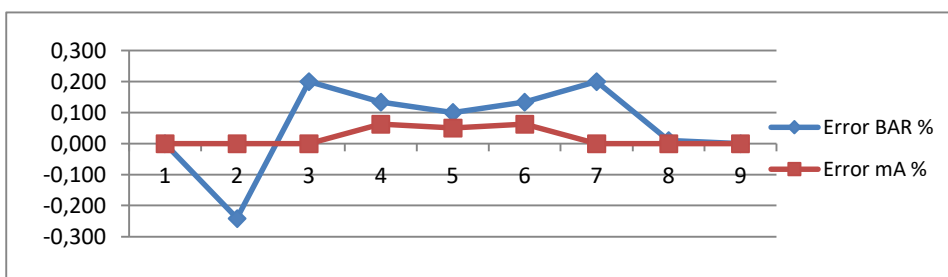

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: incertidumbre 0,4 El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico LISANDRO URBANO

Revisado L. GUEMBERENA
