

Flix Instrumentacion
Guido Spano 24, Fray Luis Beltran
Tel: 0341-152107596



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	TRANSMISOR DE TEMP.
Tag:	SCI 14P
Marca:	E+H
Modelo:	TMT 82
S/N:	TB03F11430C
Rango:	100 °c

Información de calibración	
N° de Acta	30100059
Procedimiento:	Contraste
Fecha:	05/11/2024
Fluido de prueba	-
Cliente	Bunge SJS

Patrones utilizados


Tag	Marca	Modelo	N°Serie	CALIBRADO
F-UI-03	FLUKE	754	63830017	21/12/2023

UNIDAD: °C

Inicial	25,020	50,020	75,020	100,020	0,000		
Final	25,020	50,020	75,020	100,020	0,000		
Patron	25,000	50,000	75,000	100,000	0,000		
Error %	-0,080	-0,040	-0,027	-0,020	0,000	0,000	0,000

UNIDAD: mA

Inicial	7,920	11,960	15,990	19,860			
Final	7,920	11,960	15,990	19,860			
Patron	8,000	12,000	16,000	20,000			
Error %	1,000	0,333	0,062	0,700	0,000	0,000	0,000

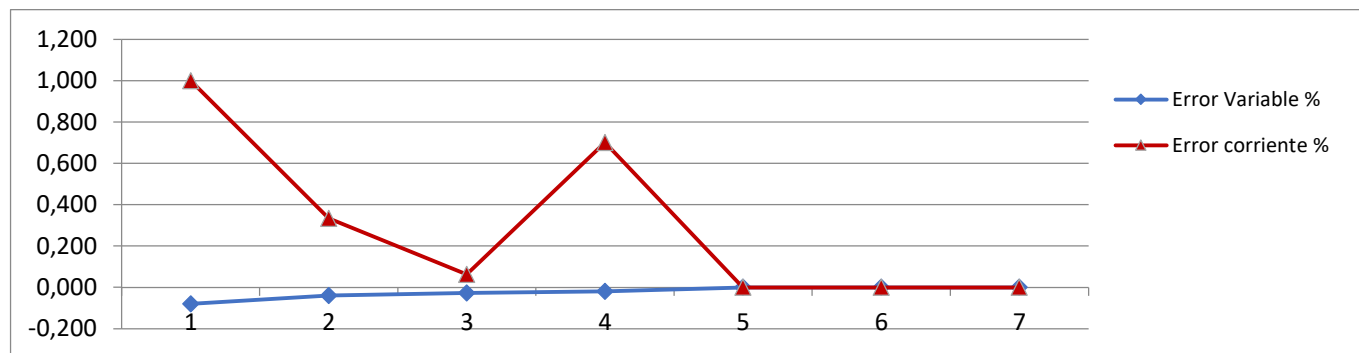

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico RODRIGO MAGALLANES

Revisado Lisandro Urbano

