

Flix Instrumentacion
Guido Spano 24, Fray Luis Beltran
Tel: 0341-152107596



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	TRANSMISOR DE TEMP.
Tag:	TIR 22
Marca:	ABB
Modelo:	TTH 300
S/N:	2086542
Rango:	150°C

Información de calibración	
N° de Acta	30100044
Procedimiento:	Contraste
Fecha:	14/11/2023
Fluido de prueba	-
Cliente	Bunge SJ

Patrones utilizados


Tag	Marca	Modelo	N°Serie	CALIBRADO
FLIX-PI-01	Druck	PM 620IS	3659498	14/12/2022

UNIDAD: °C

Inicial	50,210	75,800	100,040	148,000	100,040	75,800	50,210
Final	50,210	75,800	100,040	148,000	100,040	75,800	50,210
Patron	50,000	75,000	100,000	150,000	100,000	75,000	50,000
Error %	-0,420	-1,067	-0,040	1,333	-0,040	-1,067	-0,420

UNIDAD: mA

Inicial	9,350	12,210	14,500	19,660	14,500	12,210	9,350
Final	9,350	12,210	14,500	19,660	14,500	12,210	9,350
Patron	9,220	12,100	14,513	19,999	14,513	12,100	9,220
Error %	-1,410	-0,909	0,090	1,695	0,090	-0,909	-1,410

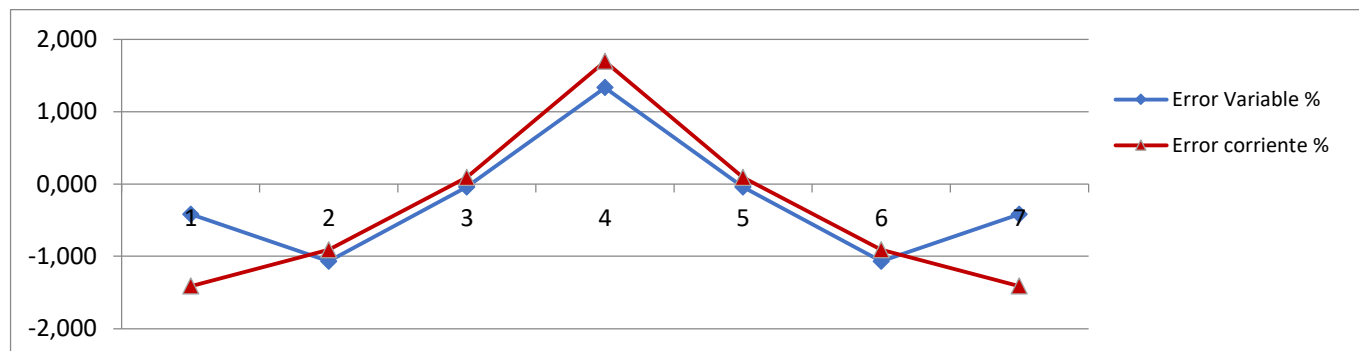

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico Lisandro Urbano

Revisado L. GUEMBERENA

