

Flix Instrumentacion
Guido Spano 24, Fray Luis Beltran
Tel: 0341-152107596



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	TRANSMISOR DE TEMP.
Tag:	TICR-70S-GIR
Marca:	Novus
Modelo:	TX Block
S/N:	19157935
Rango:	150°C

Información de calibración	
N° de Acta	30100046
Procedimiento:	Contraste
Fecha:	14/11/2023
Fluido de prueba	-
Cliente	Bunge SJ

Patrones utilizados


Tag	Marca	Modelo	N°Serie	CALIBRADO
FLIX-PI-01	Druck	PM 620IS	3659498	14/12/2022

UNIDAD: °C

Inicial	51,000	75,250	100,500	151,000	100,500	75,250	51,000
Final	51,000	75,250	100,500	151,000	100,500	75,250	51,000
Patron	50,000	75,000	100,000	150,000	100,000	75,000	50,000
Error %	-2,000	-0,333	-0,500	-0,667	-0,500	-0,333	-2,000

UNIDAD: mA

Inicial	9,500	12,150	14,497	20,030	14,497	12,150	9,500
Final	9,500	12,150	14,497	20,030	14,497	12,150	9,500
Patron	9,300	12,000	14,500	20,000	14,500	12,000	9,300
Error %	-2,151	-1,250	0,021	-0,150	0,021	-1,250	-2,151

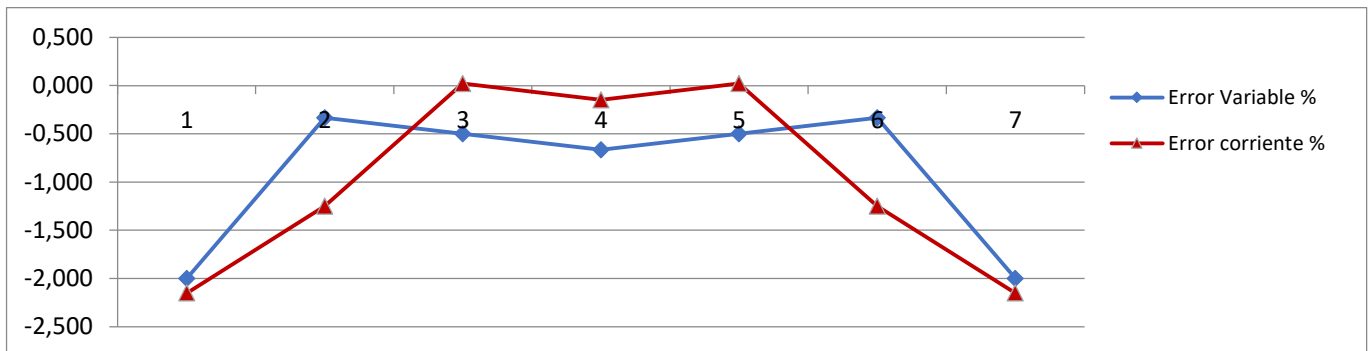

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico Lisandro Urbano

Revisado L. GUEMBERENA

