

Flix Instrumentacion
Guido Spano 24, Fray Luis Beltran
Tel: 0341-152107596



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	TRANSMISOR DE TEMP.
Tag:	TIR 22
Marca:	ABB
Modelo:	TTH 300
S/N:	2086542
Rango:	150 °c

Información de calibración	
N° de Acta	30100058
Procedimiento:	Contraste
Fecha:	05/11/2024
Fluido de prueba	-
Cliente	Bunge SJS

Patrones utilizados


Tag	Marca	Modelo	N°Serie	CALIBRADO
F-UI-03	FLUKE	754	63830017	21/12/2023

UNIDAD: °C

Inicial	37,100	75,120	112,100	150,080	0,000		
Final	37,100	75,120	112,100	150,080	0,000		
Patron	37,000	75,000	112,000	150,000	0,000		
Error %	-0,270	-0,160	-0,089	-0,053	0,000	0,000	0,000

UNIDAD: mA

Inicial	8,010	12,012	16,080	20,000			
Final	8,010	12,012	16,080	20,000			
Patron	8,000	12,000	16,000	20,000			
Error %	-0,125	-0,100	-0,500	0,000	0,000	0,000	0,000

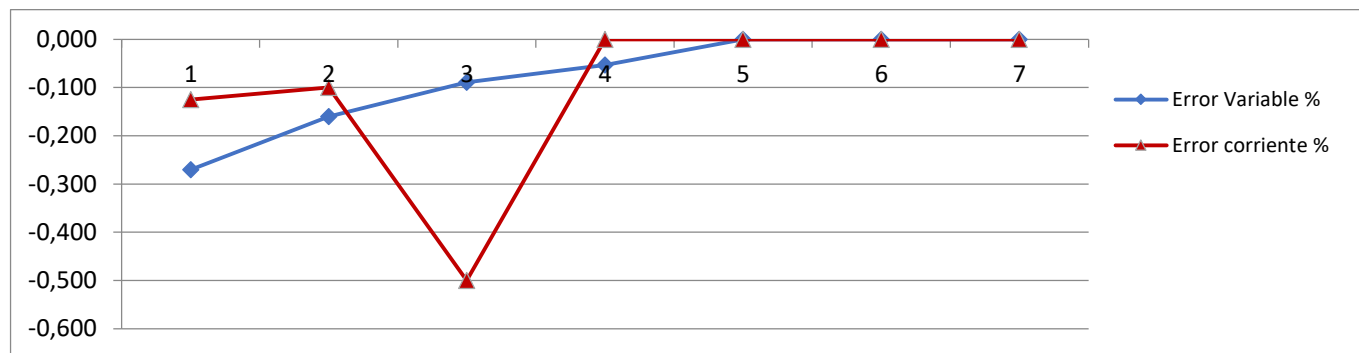

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico RODRIGO MAGALLANES

Revisado Lisandro Urbano

